



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

MEMO Nº. ____ / 2021.

Itaguatins - TO, 15 de setembro de 2021.

A Excelentíssima Senhora Prefeita

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAGUATINS/TO.

Item	Classificação Orçamentária:	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 03.03.04.122.0004.2.006 - MANUTENÇÃO DA SEC, MUN, DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		
Modalidade da licitação: () Convite () Tomada de Preço () Concorrência (X) Pregão		() Dispensa	() Inexigibilidade

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente Licitação pela necessidade de mobiliar as salas e gabinete do novo prédio da Prefeitura Municipal de Itaguatins/TO, assim oferecer melhores condições de trabalhos e otimização dos espaços existentes. Pois, os móveis atuais não apresentam mais condições favoráveis para as atividades que são exercidas, apresentando estado de precariedade. A aquisição de mobiliário projetado para a Prefeitura Municipal de Itaguatins compõe um conjunto de iniciativas que tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados nesse município e ofertar melhor qualidade aos servidores e comunidade de Itaguatins/TO. Para alcançar resultados fundamentais, faz-se necessário a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os seus setores, dentro das condições exigidas de conforto, comodidade e segurança. Por suas peculiaridades tais itens necessitam serem fabricados conforme projeto específico para atender padrões satisfatórios de qualidade e ergonomia.

Autorizo, observadas as normas legais vigentes.

Itaguatins - TO, em 15 de Setembro de 2021.

Maria Ivoneide Matos Barreto
Prefeita Municipal

Ratificação Orçamentária da Secretaria Municipal de Finanças

Itaguatins - TO, em 15 de Setembro de 2021.

Adonedes Queiroz de Souza
Secretário Municipal Administração Finanças Planejamento

FRANCISCO MATHEUS DA SILVA TEXEIRA

CNPJ: 37.636.302/0001-60

RUA NOVA - Nº 719 - CENTRO - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS							BDI (R\$)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO							23,00%
OBJETO	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (Sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Item							
1		SALA DE LICITAÇÕES					R\$ 32.949,91
1.1		SALA DE LICITAÇÕES					R\$ 32.949,91
1.1.1	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM 1 PORTA BASCULANTE (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 615,47	R\$ 757,00	R\$ 2.271,00
1.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 615,63	R\$ 757,20	R\$ 2.271,60
1.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE BALCÃO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,90X0,45)	UNID	4,00	R\$ 729,58	R\$ 897,36	R\$ 3.589,44
1.1.4	COMP	EXECUÇÃO ARMÁRIO DE CANTO L (1,00X1,00X1,02)	UNID	1,00	R\$ 911,91	R\$ 1.121,61	R\$ 1.121,61
1.1.5	COMP	BALCÃO DE CANTO L 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 924,92	R\$ 1.137,61	R\$ 1.137,61
1.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,56X0,35)	UNID	4,00	R\$ 342,13	R\$ 420,80	R\$ 1.683,20
1.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,50X0,35)	UNID	4,00	R\$ 259,07	R\$ 318,64	R\$ 1.274,56
1.1.8	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,60X0,60X0,40)	M2	8,00	R\$ 790,78	R\$ 972,62	R\$ 7.780,96
1.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,42	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 6.005,67
1.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	20,75	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 4.805,70
1.1.11	COMP	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF 01/2021 P	M2	2,34	R\$ 350,43	R\$ 431,01	R\$ 1.008,56
							R\$ 15.928,30
2		PROTOCOLO					R\$ 15.928,30
2.1		PROTOCOLO					R\$ 15.928,30
2.1.1	COMP	ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE (0,80X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 496,18	R\$ 610,28	R\$ 610,28
2.1.2	COMP	ARMÁRIO COM 1 PORTA (0,51X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 435,38	R\$ 535,50	R\$ 535,50
2.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 361,58	R\$ 444,73	R\$ 444,73
2.1.4	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,80X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 376,95	R\$ 463,63	R\$ 463,63
2.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,45X0,40)	UNID	4,00	R\$ 365,65	R\$ 449,73	R\$ 1.798,92
2.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,45X0,40)	UNID	2,00	R\$ 408,07	R\$ 501,91	R\$ 1.003,82
2.1.7	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,73X0,78X0,55)	UNID	1,00	R\$ 660,15	R\$ 811,96	R\$ 811,96
2.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 790,36	R\$ 972,11	R\$ 1.944,22
2.1.9	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	1,00	R\$ 580,32	R\$ 713,77	R\$ 713,77
2.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 411,40	R\$ 506,00	R\$ 1.012,00
2.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,25X0,40X0,55)	UNID	2,00	R\$ 359,26	R\$ 436,95	R\$ 873,90
2.1.12	COMP	EXECUÇÃO DE CANTO L 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 724,92	R\$ 897,61	R\$ 1.137,61
2.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,33	R\$ 468,00	R\$ 576,62	R\$ 1.905,30
2.1.14	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	11,54	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.672,66
							R\$ 19.832,84
3		FINANCEIRO					R\$ 19.832,84
3.1		FINANCEIRO					R\$ 19.832,84
3.1.1	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,8X0,45X0,35)	UNID	2,00	R\$ 623,23	R\$ 766,55	R\$ 1.533,10
3.1.2	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,8X0,9X0,55)	UNID	2,00	R\$ 702,35	R\$ 863,86	R\$ 1.727,72
3.1.3	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,9X0,75X0,45)	UNID	1,00	R\$ 698,90	R\$ 847,32	R\$ 847,32
3.1.4	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,9X0,6X0,35)	UNID	1,00	R\$ 623,77	R\$ 767,21	R\$ 767,21
3.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,80X0,40X0,35)	UNID	6,00	R\$ 376,95	R\$ 463,63	R\$ 2.781,78
3.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,60X0,35)	UNID	3,00	R\$ 180,00	R\$ 221,89	R\$ 664,17
3.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,4X0,35)	UNID	3,00	R\$ 372,95	R\$ 458,71	R\$ 1.376,13
3.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,4)	UNID	2,00	R\$ 766,39	R\$ 942,63	R\$ 1.885,26
3.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,6)	UNID	1,00	R\$ 820,10	R\$ 1.008,69	R\$ 1.008,69
3.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	3,00	R\$ 392,70	R\$ 483,00	R\$ 1.449,60
3.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,25X0,40X0,55)	UNID	2,00	R\$ 302,20	R\$ 371,69	R\$ 743,38
3.1.12	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,87	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 2.230,51
3.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	12,17	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.818,57
							R\$ 15.681,99
4		GABINETE					R\$ 15.681,99
4.1		GABINETE					R\$ 15.681,99
4.1.1	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,8X0,9X0,55)	UNID	4,00	R\$ 715,37	R\$ 879,87	R\$ 3.519,48
4.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,5)	UNID	1,00	R\$ 884,18	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50
4.1.3	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,7X0,5)	UNID	2,00	R\$ 534,56	R\$ 662,08	R\$ 1.364,16
4.1.4	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,60X0,60X0,40)	UNID	1,00	R\$ 790,78	R\$ 972,62	R\$ 972,62
4.1.5	COMP	COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NINCHO (0,6X0,7X0,5)	UNID	1,00	R\$ 453,15	R\$ 557,35	R\$ 557,35
4.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,6X0,35)	UNID	1,00	R\$ 381,83	R\$ 469,63	R\$ 469,63
4.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,04	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 5.788,65
4.1.8	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	8,31	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 1.924,60
							R\$ 84.393,04
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 84.393,04

Sítio Novo do Tocantins, 16 de setembro de 2021.

Francisco Matheus da Silva Teixeira



FRANCISCO MATHEUS DA SILVA TEXEIRA

CNPJ: 37.636.302/0001-60

RUA NOVA - N° 719 - CENTRO - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS



CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO									
OBJETO	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO								BDI: 23%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA			
1.	SALA DE LICITAÇÕES	R\$ 32.949,91	39,04%	R\$ 28.007,42	R\$ 4.942,49	R\$ 0,00	15,60%	R\$ 0,00	0,00%
2.	PROTOCOLO	R\$ 15.928,30	18,87%	R\$ 0,00	R\$ 15.928,30	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.	FINANCEIRO	R\$ 19.832,84	23,50%	R\$ 0,00	R\$ 9.916,42	R\$ 9.916,42	50,00%	R\$ 9.916,42	50,00%
4.	GABINETE	R\$ 15.681,99	18,58%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.681,99	100,00%	R\$ 15.681,99	100,00%
TOTAIS DO PERÍODO		R\$ 84.393,04	100,00%	R\$ 28.007,42	R\$ 30.787,21	R\$ 25.598,41	36,48%	R\$ 25.598,41	30,33%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 84.393,04	100,00%	R\$ 28.007,42	R\$ 58.794,63	R\$ 84.393,04	69,67%	R\$ 84.393,04	100,00%

Resumo do Valor da Licitação

FRANCISCO MATHEUS DA SILVA TEXEIRA

CNPJ: 37.636.302/0001-60

RUA NOVA - Nº 719 - CENTRO - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,40%
2	Risco	0,56%
3	Despesas Financeiras	1,03%
4	Administração Central	3,80%
5	Lucro	7,90%
II - Tributos %		
6	COFINS	3,00%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	3,50%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)		23,00%

AC = taxa de rateio da Administração Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

S = taxa de seguro do empreendimento;

G = taxa de garantia do empreendimento;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro.

T = taxa de tributos;

01 - CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Francisco
Matheus
da Silva
Teixeira

STYLO MARMORARIA EIRELE-ME

CNPJ: 20.725.090/0001-14
Rua: 100, Centro, São Paulo de Tocantins

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS							
PROPOSTA DE PREÇO							
OBJETO							BDI (R\$)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO							25,00%
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (Sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
							R\$ 31.986,91
							R\$ 31.986,91
1.		SALA DE LICITAÇÕES					
1.1		SALA DE LICITAÇÕES					
1.1.1	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM 1 PORTA BASCULANTE (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 619,47	R\$ 757,00	R\$ 2.271,00
1.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 615,63	R\$ 757,20	R\$ 2.271,00
1.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE BALCÃO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,90X0,45)	UNID	4,00	R\$ 729,59	R\$ 897,36	R\$ 3.589,44
1.1.4	COMP	EXECUÇÃO ARMÁRIO DE CANTO L (1,00X1,00X1,02)	UNID	1,00	R\$ 702,00	R\$ 883,43	R\$ 883,43
1.1.5	COMP	BALCÃO DE CANTO L 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 624,92	R\$ 777,61	R\$ 1.137,61
1.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,50X0,35)	UNID	4,00	R\$ 342,13	R\$ 420,80	R\$ 1.683,20
1.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,50X0,35)	UNID	4,00	R\$ 120,00	R\$ 147,59	R\$ 590,36
1.1.8	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,50X0,50X0,40)	UNID	8,00	R\$ 790,78	R\$ 972,62	R\$ 7.780,96
1.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,42	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 6.005,67
1.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	20,78	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 4.850,70
1.1.11	COMP	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,34	R\$ 342,95	R\$ 421,81	R\$ 987,04
							R\$ 15.633,84
							R\$ 15.633,84
2.		PROTOCOLO					
2.1		PROTOCOLO					
2.1.1	COMP	ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE (0,50X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 496,18	R\$ 610,28	R\$ 610,28
2.1.2	COMP	ARMÁRIO COM 1 PORTA (0,51X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 435,38	R\$ 535,50	R\$ 535,50
2.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 361,68	R\$ 444,73	R\$ 444,73
2.1.4	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 375,95	R\$ 463,63	R\$ 463,63
2.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,45X0,40)	UNID	4,00	R\$ 365,65	R\$ 449,73	R\$ 1.798,92
2.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,45X0,40)	UNID	2,00	R\$ 406,07	R\$ 501,91	R\$ 1.003,82
2.1.7	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,73X0,78X0,55)	UNID	1,00	R\$ 650,15	R\$ 811,96	R\$ 811,96
2.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,5)	UNID	2,00	R\$ 790,35	R\$ 972,11	R\$ 1.944,22
2.1.9	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	1,00	R\$ 580,32	R\$ 718,77	R\$ 718,77
2.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 411,40	R\$ 506,00	R\$ 1.012,00
2.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 355,28	R\$ 436,95	R\$ 873,90
2.1.12	COMP	BALCÃO DE CANTO L 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 524,92	R\$ 646,89	R\$ 1.197,81
2.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,31	R\$ 395,70	R\$ 486,69	R\$ 1.610,94
2.1.14	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	11,54	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.672,95
							R\$ 19.632,84
							R\$ 19.632,84
3.		FINANCEIRO					
3.1		FINANCEIRO					
3.1.1	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,8X0,45X0,35)	UNID	2,00	R\$ 623,23	R\$ 766,65	R\$ 1.533,30
3.1.2	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,5X0,9X0,55)	UNID	2,00	R\$ 703,25	R\$ 863,66	R\$ 1.727,32
3.1.3	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,9X0,75X0,45)	UNID	1,00	R\$ 688,90	R\$ 847,32	R\$ 847,32
3.1.4	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,5X0,6X0,35)	UNID	1,00	R\$ 623,27	R\$ 767,21	R\$ 767,21
3.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,80X0,40X0,35)	UNID	6,00	R\$ 376,65	R\$ 463,63	R\$ 2.781,78
3.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,6X0,35)	UNID	3,00	R\$ 190,00	R\$ 221,39	R\$ 664,17
3.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,4X0,35)	UNID	5,00	R\$ 372,65	R\$ 458,71	R\$ 1.376,13
3.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,4)	UNID	2,00	R\$ 786,39	R\$ 942,63	R\$ 1.885,26
3.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,6)	UNID	1,00	R\$ 820,10	R\$ 1.005,69	R\$ 1.005,69
3.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	3,00	R\$ 392,70	R\$ 482,00	R\$ 1.446,00
3.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,25X0,40X0,55)	UNID	2,00	R\$ 392,20	R\$ 371,69	R\$ 743,38
3.1.12	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,87	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 2.230,51
3.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	12,17	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.818,57
							R\$ 15.481,99
							R\$ 15.481,99
4.		GABINETE					
4.1		GABINETE					
4.1.1	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,8X0,9X0,55)	UNID	4,00	R\$ 715,37	R\$ 870,87	R\$ 3.483,48
4.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,6)	UNID	1,00	R\$ 984,18	R\$ 1.087,90	R\$ 1.087,90
4.1.3	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,7X0,5)	UNID	2,00	R\$ 564,55	R\$ 682,06	R\$ 1.364,16
4.1.4	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,50X0,60X0,40)	UNID	1,00	R\$ 790,78	R\$ 972,62	R\$ 972,62
4.1.5	COMP	COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NINCHO (0,6X0,7X0,5)	UNID	1,00	R\$ 463,16	R\$ 557,39	R\$ 557,39
4.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,6X0,35)	UNID	1,00	R\$ 381,63	R\$ 469,63	R\$ 469,63
4.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,04	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 5.786,66
4.1.8	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	8,31	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 1.924,60
							R\$ 83.134,79
							R\$ 83.134,79
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 83.134,79

Sítio Novo do Tocantins, 16 de setembro de 2021.

João Paulo Lins de Sousa

STYLO MARMORARIA EIRELE-ME

CNPJ- 26.722.580/0001-14

Rodovia TO 392, Centro, Sítio Novo do Tocantins

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO									
OBJETO		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINGA - TO				BDI: 23%			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA			
1.	SALA DE LICITAÇÕES	R\$ 31.986,01	38,47%	R\$ 27.188,11	R\$ 4.797,90	R\$ 0,00	15,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.	PROTOCOLO	R\$ 15.633,94	18,81%	R\$ 0,00	R\$ 15.633,94	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.	FINANCEIRO	R\$ 19.832,84	23,86%	R\$ 0,00	R\$ 9.916,42	R\$ 9.916,42	50,00%	R\$ 9.916,42	50,00%
4.	GABINETE	R\$ 15.681,99	18,86%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.681,99	100,00%	R\$ 15.681,99	100,00%
TOTAIS DO PERÍODO		R\$ 83.134,78	100,00%	R\$ 27.188,11	R\$ 30.548,26	R\$ 25.598,41	36,50%	R\$ 25.598,41	30,79%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 83.134,78	100,00%	R\$ 27.188,11	R\$ 57.536,37	R\$ 83.134,78	69,21%	R\$ 83.134,78	100,00%

Jean Paulo Furtado Dias



STYLO MARMORARIA EIRELE-ME

CNPJ: 26.722.580/0001-14

Rodovia TO 392, Centro, Sítio Novo do Tocantins

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,40%
2	Risco	0,56%
3	Despesas Financeiras	1,03%
4	Administração Central	3,80%
5	Lucro	7,90%
II - Tributos %		
6	COFINS	3,00%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	3,50%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)		23,00%

AC = taxa de rateio da Administração Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

S = taxa de seguro do empreendimento;

G = taxa de garantia do empreendimento;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro.

T = taxa de tributos;

01 - CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

João Paulo Teixeira Dias

FRANCISCO FEITOSA DIAS

CNPJ: 33.361929/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS							
PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS							
OBJETO							BDI (R\$)
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO							23,00%
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (Sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (Com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.		SALA DE LICITAÇÕES					R\$ 32.768,64
1.1		SALA DE LICITAÇÕES					R\$ 32.768,64
1.1.1	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM 1 PORTA BASCULANTE (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 615,47	R\$ 757,00	R\$ 2.271,00
1.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,50X0,35)	UNID	3,00	R\$ 615,43	R\$ 757,20	R\$ 2.271,60
1.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE BALCÃO EM MDF 2 PORTAS (1,00X0,90X0,45)	UNID	4,00	R\$ 729,59	R\$ 897,36	R\$ 3.589,44
1.1.4	COMP	EXECUÇÃO DE BALCÃO DE CANTO L (1,00X1,00X1,02)	UNID	1,00	R\$ 804,00	R\$ 988,88	R\$ 988,88
1.1.5	COMP	BALCÃO DE CANTO L, 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 924,92	R\$ 1.137,61	R\$ 1.137,61
1.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,50X0,35)	UNID	4,00	R\$ 342,13	R\$ 420,80	R\$ 1.683,20
1.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,50X0,35)	UNID	4,00	R\$ 150,00	R\$ 184,49	R\$ 737,96
1.1.8	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,60X0,60X0,40)	UNID	8,00	R\$ 780,78	R\$ 972,62	R\$ 7.780,96
1.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,42	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 6.005,67
1.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	20,75	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 4.805,70
1.1.11	COMP	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BASQUETE AF. 01/2021	M2	2,34	R\$ 320,00	R\$ 639,58	R\$ 1.496,62
2.		PROTOCOLO					R\$ 15.633,94
2.1		PROTOCOLO					R\$ 15.633,94
2.1.1	COMP	ARMÁRIO COM PORTA BASCULANTE (0,80X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 496,18	R\$ 610,28	R\$ 610,28
2.1.2	COMP	ARMÁRIO COM 1 PORTA (0,51X0,50X0,35)	UNID	1,00	R\$ 435,38	R\$ 535,50	R\$ 535,50
2.1.3	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 361,58	R\$ 444,73	R\$ 444,73
2.1.4	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,80X0,40X0,35)	UNID	1,00	R\$ 375,95	R\$ 463,63	R\$ 463,63
2.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,50X0,45X0,40)	UNID	4,00	R\$ 365,65	R\$ 449,73	R\$ 1.798,92
2.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (1,00X0,45X0,40)	UNID	2,00	R\$ 408,07	R\$ 501,91	R\$ 1.003,82
2.1.7	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,73X0,78X0,55)	UNID	1,00	R\$ 660,15	R\$ 811,36	R\$ 811,36
2.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 790,36	R\$ 972,11	R\$ 1.944,22
2.1.9	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	1,00	R\$ 580,32	R\$ 713,77	R\$ 713,77
2.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 411,40	R\$ 506,99	R\$ 1.013,98
2.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,25X0,40X0,55)	UNID	2,00	R\$ 355,26	R\$ 436,95	R\$ 873,90
2.1.12	COMP	BALCÃO DE CANTO L, 2 PORTAS (1,00X0,90X1,00)	UNID	1,00	R\$ 934,92	R\$ 1.137,61	R\$ 1.137,61
2.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,31	R\$ 385,70	R\$ 476,60	R\$ 1.610,94
2.1.14	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	11,54	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.672,66
3.		FINANCEIRO					R\$ 30.461,64
3.1		FINANCEIRO					R\$ 20.461,64
3.1.1	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,8X0,41X0,35)	UNID	2,00	R\$ 623,23	R\$ 766,55	R\$ 1.533,10
3.1.2	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,8X0,9X0,55)	UNID	2,00	R\$ 702,55	R\$ 865,86	R\$ 1.727,72
3.1.3	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,9X0,75X0,45)	UNID	1,00	R\$ 688,90	R\$ 847,32	R\$ 847,32
3.1.4	COMP	ARMÁRIO 2 PORTAS (0,9X0,60X0,35)	UNID	1,00	R\$ 623,77	R\$ 767,21	R\$ 767,21
3.1.5	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,80X0,40X0,35)	UNID	6,00	R\$ 375,95	R\$ 463,63	R\$ 2.781,78
3.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,6X0,35)	UNID	3,00	R\$ 350,41	R\$ 430,98	R\$ 1.292,97
3.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,40X0,35)	UNID	3,00	R\$ 372,35	R\$ 458,71	R\$ 1.376,13
3.1.8	COMP	GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,4X0,75X0,6)	UNID	2,00	R\$ 766,39	R\$ 942,63	R\$ 1.885,26
3.1.9	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,6)	UNID	1,00	R\$ 820,10	R\$ 1.008,69	R\$ 1.008,69
3.1.10	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,35X0,75X0,6)	UNID	8,00	R\$ 392,70	R\$ 483,09	R\$ 1.449,00
3.1.11	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,25X0,40X0,55)	UNID	2,00	R\$ 302,20	R\$ 371,69	R\$ 743,38
3.1.12	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	3,87	R\$ 485,69	R\$ 596,39	R\$ 2.230,51
3.1.13	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	12,17	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 2.818,57
4.		GABINETE					R\$ 15.681,99
4.1		GABINETE					R\$ 15.681,99
4.1.1	COMP	BALCÃO 2 PORTAS (0,8X0,9X0,55)	UNID	4,00	R\$ 715,37	R\$ 879,87	R\$ 3.519,48
4.1.2	COMP	EXECUÇÃO DE GAVETEIRO 4 GAVETAS (0,5X0,7X0,6)	UNID	1,00	R\$ 884,18	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50
4.1.3	COMP	BALCÃO 1 PORTAS (0,4X0,7X0,5)	UNID	2,00	R\$ 554,96	R\$ 682,08	R\$ 1.364,16
4.1.4	COMP	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS (0,60X0,60X0,40)	UNID	1,00	R\$ 790,78	R\$ 972,62	R\$ 972,62
4.1.5	COMP	COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE NINCHO (0,6X0,7X0,5)	UNID	1,00	R\$ 453,15	R\$ 557,35	R\$ 557,35
4.1.6	COMP	EXECUÇÃO DE NINCHO (0,55X0,6X0,35)	UNID	1,00	R\$ 391,83	R\$ 483,09	R\$ 483,09
4.1.7	COMP	EXECUÇÃO DE PAINEL EM MDF ESPRESSURA DE 50 MM	M2	10,04	R\$ 468,60	R\$ 576,36	R\$ 5.786,65
4.1.8	COMP	EXECUÇÃO DE TAMPONAMENTO EM MDF ESPRESSURA DE 18MM	M2	8,31	R\$ 188,30	R\$ 231,60	R\$ 1.924,60
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							R\$ 84.566,21

Sítio Novo -TO, 16 de setembro de 2021

Francisco Feitosas Dias

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO									
OBJETO		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS - TO			DATA: 02 DE SETEMBRO DE 2021				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	%	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	BDI: 23%		
1.	SALA DE LICITAÇÕES	R\$ 32.768,64	38,76%	R\$ 27.853,34	R\$ 4.915,30	R\$ 0,00	0,00%		
2.	PROTOCOLO	R\$ 15.633,94	18,49%	R\$ 0,00	R\$ 15.633,94	R\$ 0,00	0,00%		
3.	FINANCEIRO	R\$ 20.461,64	24,20%	R\$ 0,00	R\$ 10.230,82	R\$ 10.230,82	50,00%		
4.	GABINETE	R\$ 15.681,99	18,55%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.681,99	100,00%		
TOTAIS DO PERÍODO		R\$ 84.546,21	100,00%	R\$ 27.853,34	R\$ 30.780,06	R\$ 25.912,81	36,41%		
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 84.546,21	100,00%	R\$ 27.853,34	R\$ 58.633,40	R\$ 84.546,21	69,35%		

Francisco A. Dias

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,40%
2	Risco	0,56%
3	Despesas Financeiras	1,03%
4	Administração Central	3,80%
5	Lucro	7,90%
II - Tributos %		
6	COFINS	3,00%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	3,50%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)		23,00%

AC = taxa de rateio da Administração Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

S = taxa de seguro do empreendimento;

G = taxa de garantia do empreendimento;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro.

T = taxa de tributos;


01 - CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS:

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Francisco D. Reis



FEITURA MUNICIPAL
11-1-17

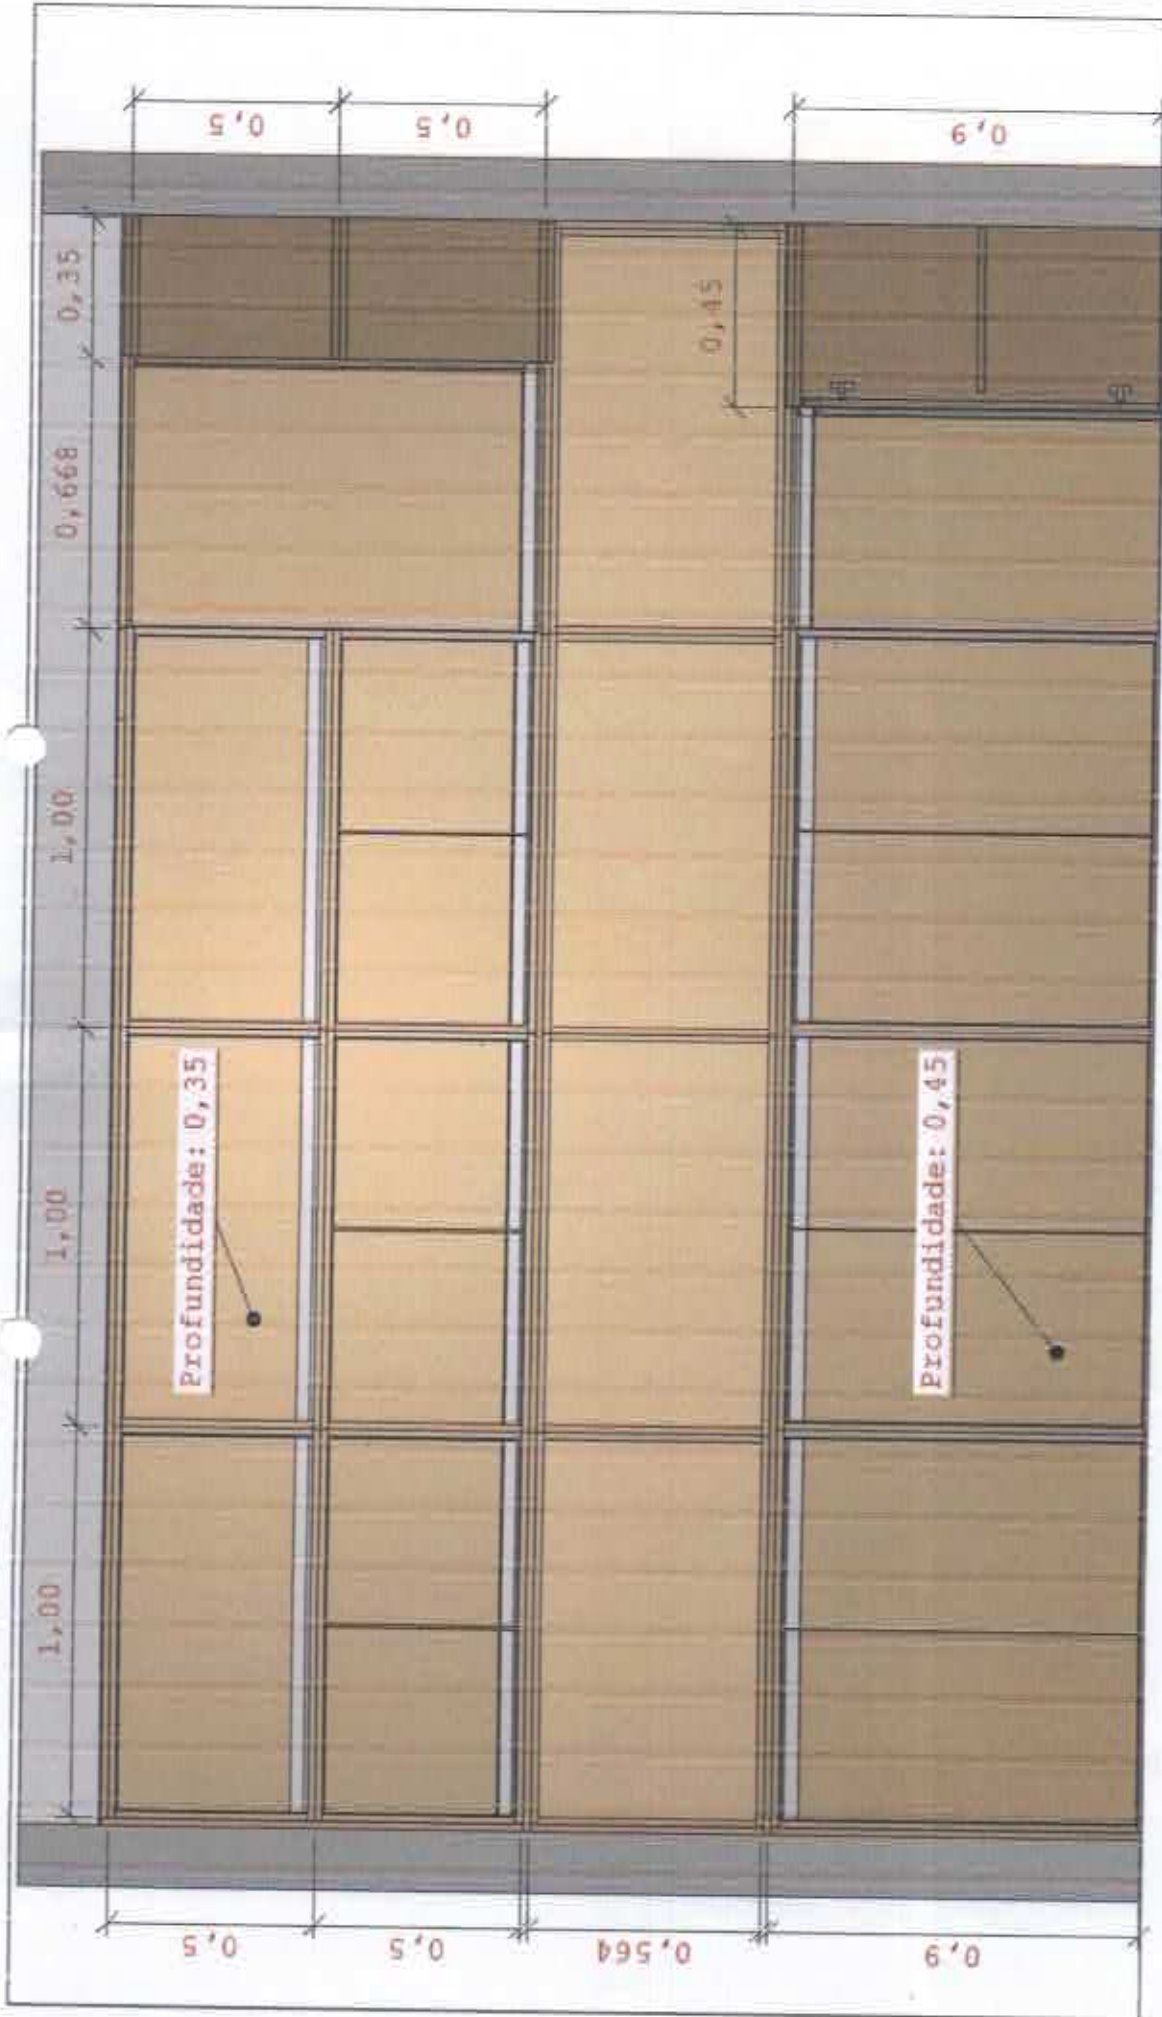


HERIKI JÔNATAS
ENGENHARIA CIVIL

Cliente:
PREFEITURA DE ITAGUATINS


Telefone:
(63) 3477-1328

Data Projeto:

Data Aprovação:

Observação:
BALCÕES E ARMARIOS - SALA DE LICITAÇÕES - FOLHA 01/02


Responsável:
HERIKI JÔNATAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUATINS

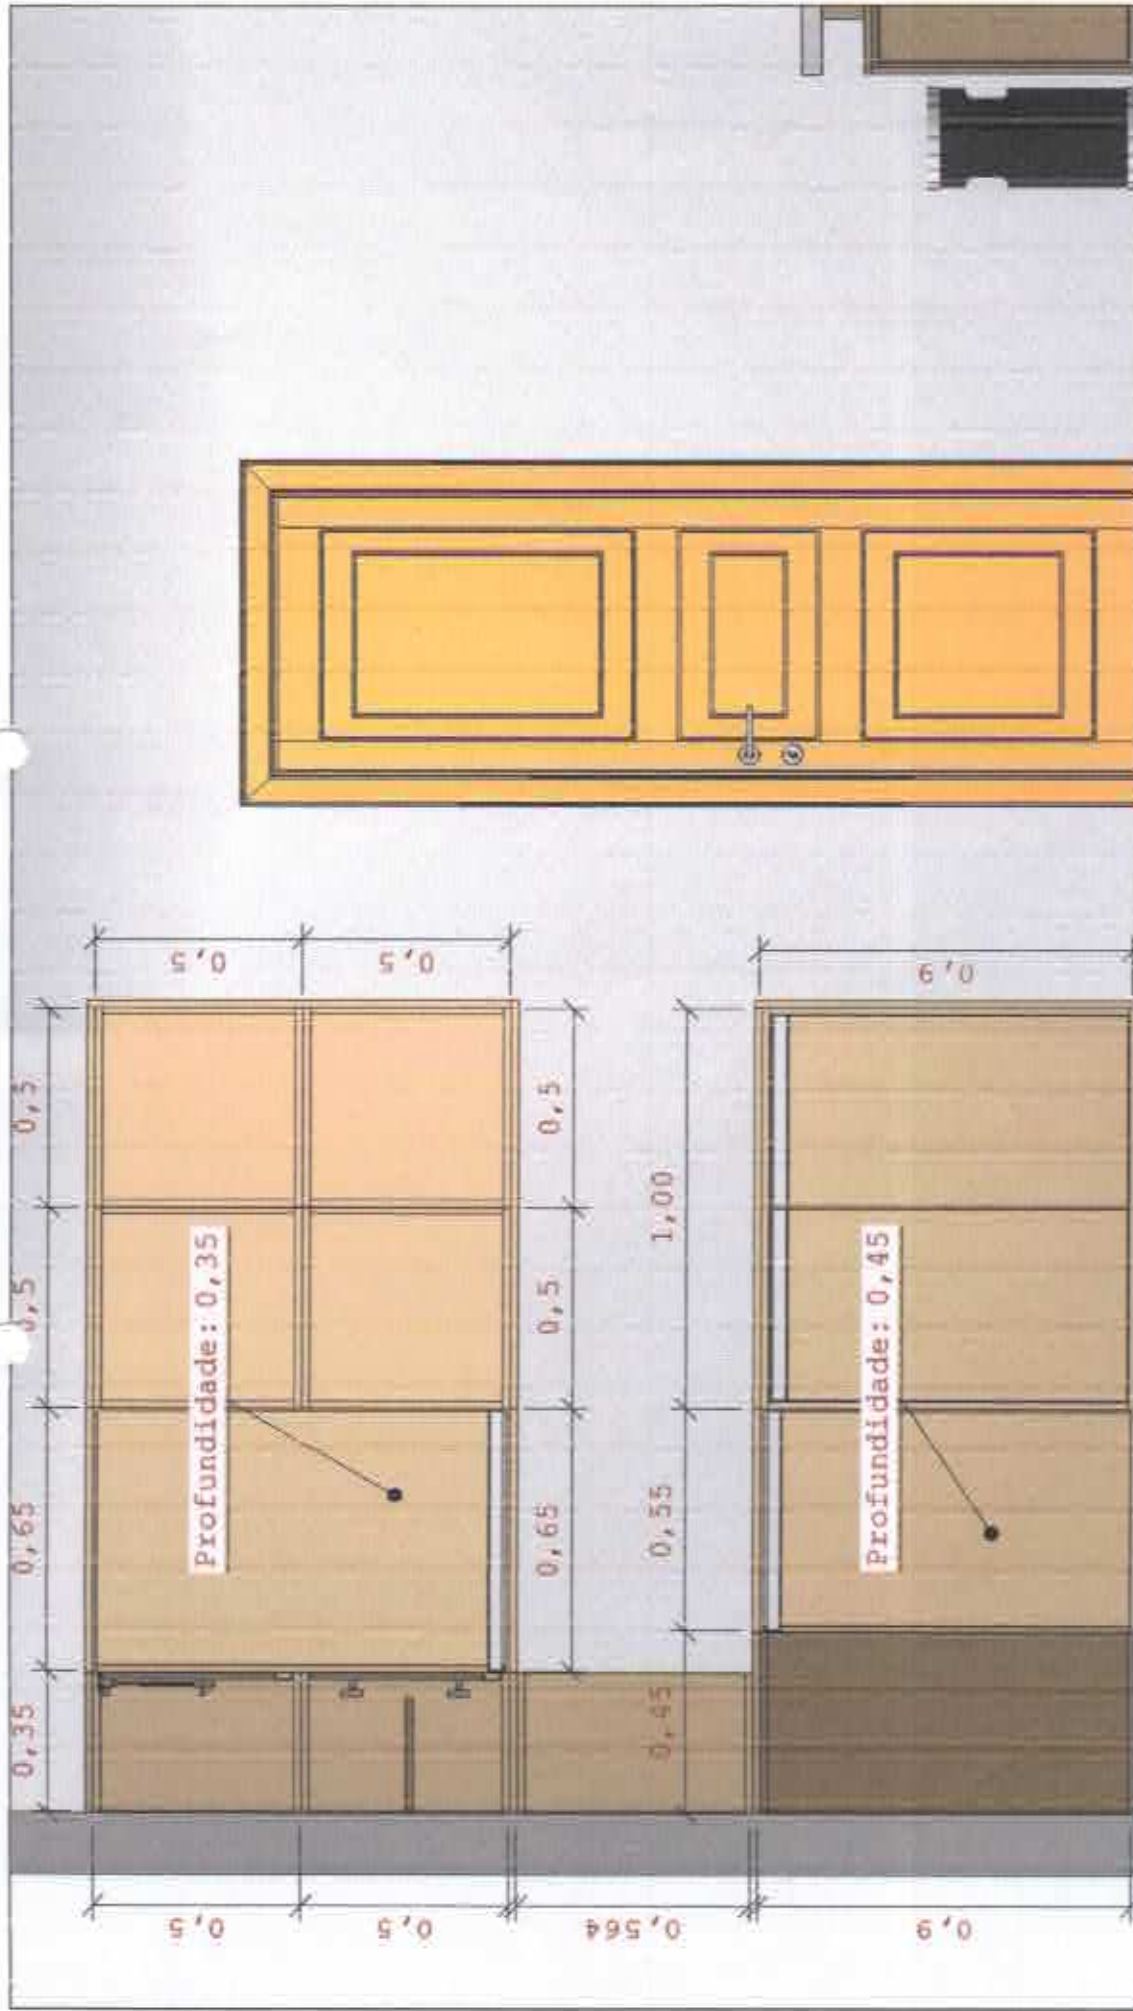

HERIKI JÓNATAS
ENGENHEIRO CIVIL

Cliente:
PREFEITURA DE ITAGUATINS

Telefone:
(63) 3477-1328

Data Projeto: / /

Data Aprovação: / /

Observação:
ARMÁRIOS E BALCÕES - SALA DE LICITAÇÕES - FOLHA 02/02

Responsável:
HERIKI JÓNATAS





Data Aprovação:

Responsável:
HERIKI JONA


HERIKI JÓNATAS
ENGINEERING CIVIL

PREFECTURA
FOLIO 14
DE INAGUATES - TO

13
#




12/12/2016

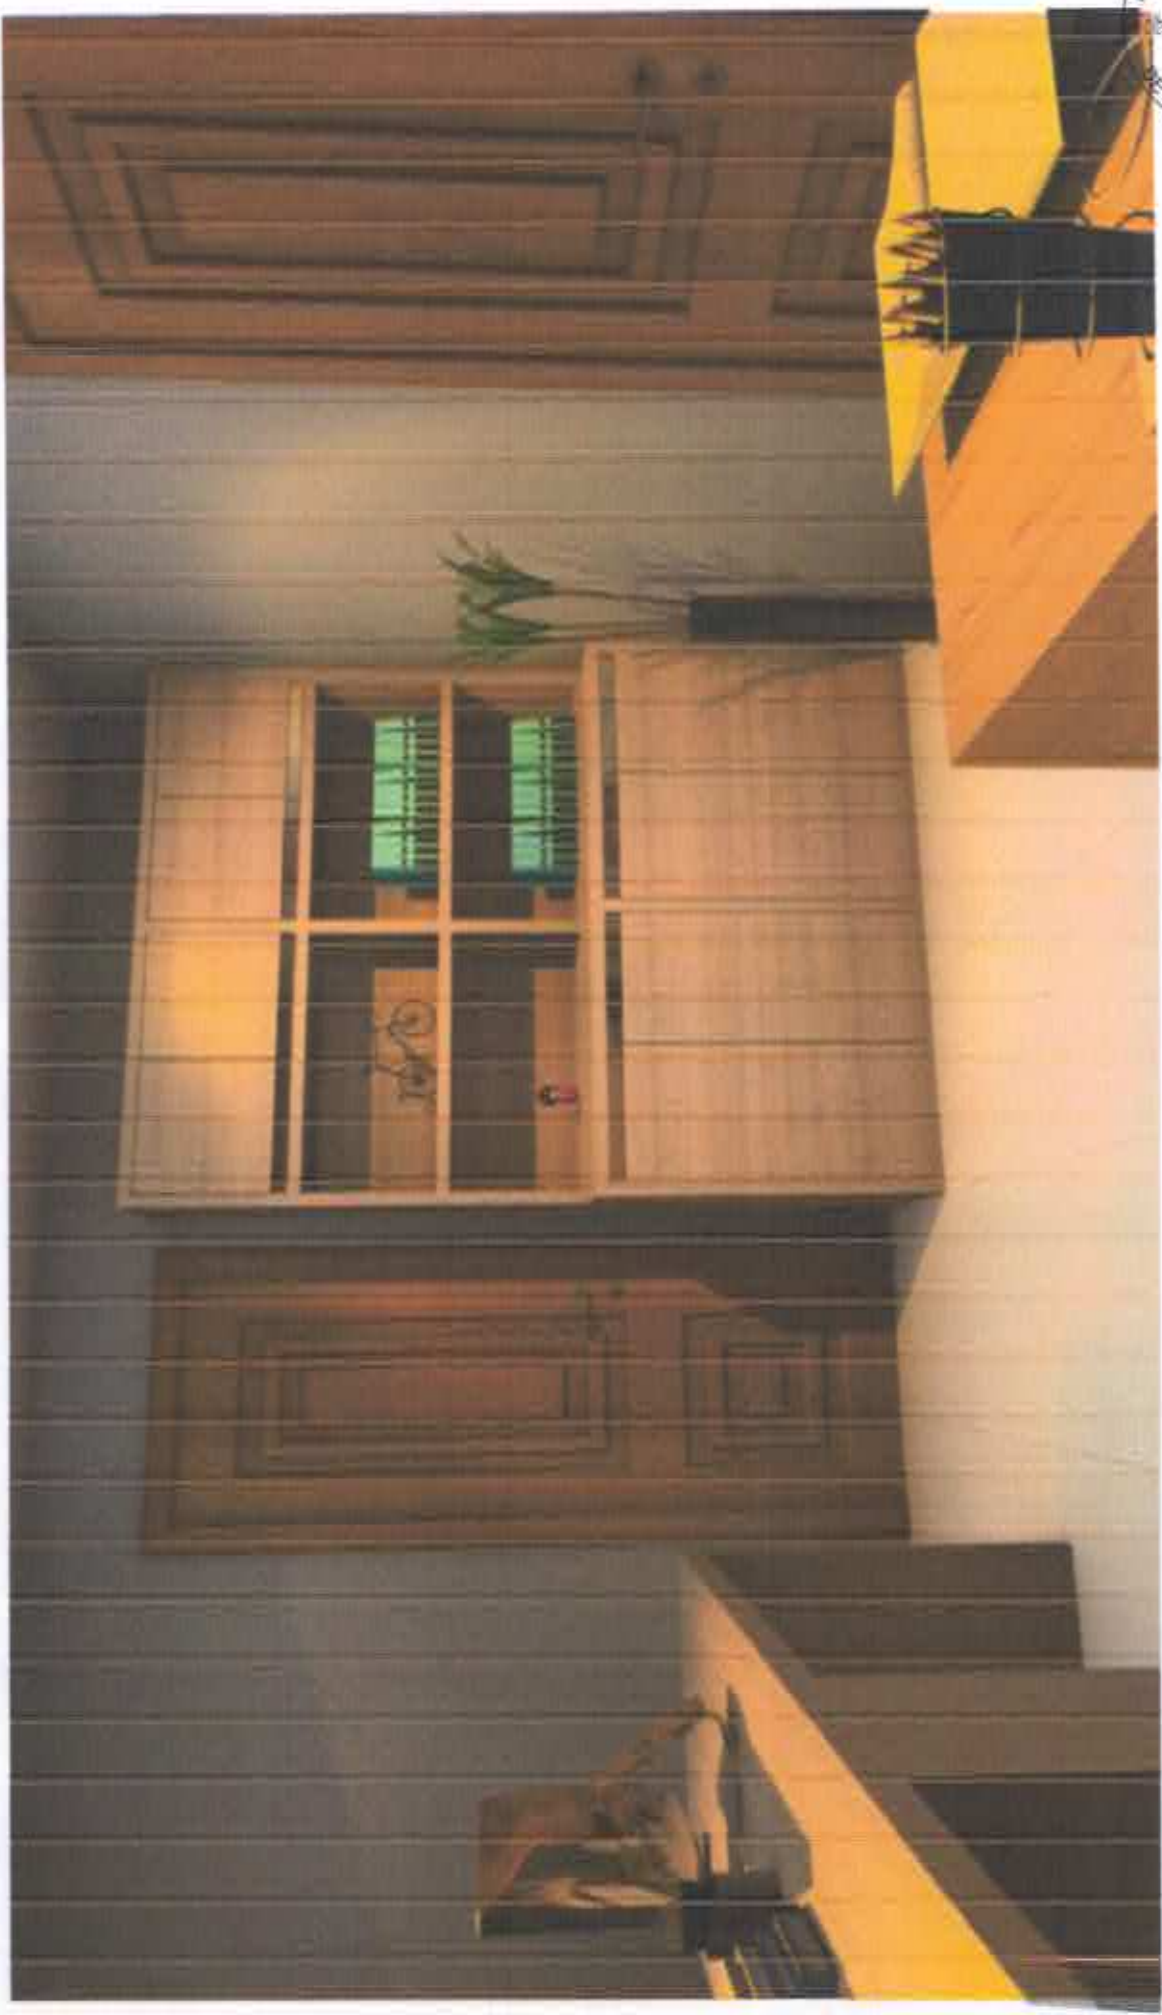




REPTILES MONITOR
117
GUARDS TO
[Signature]

15/11/18

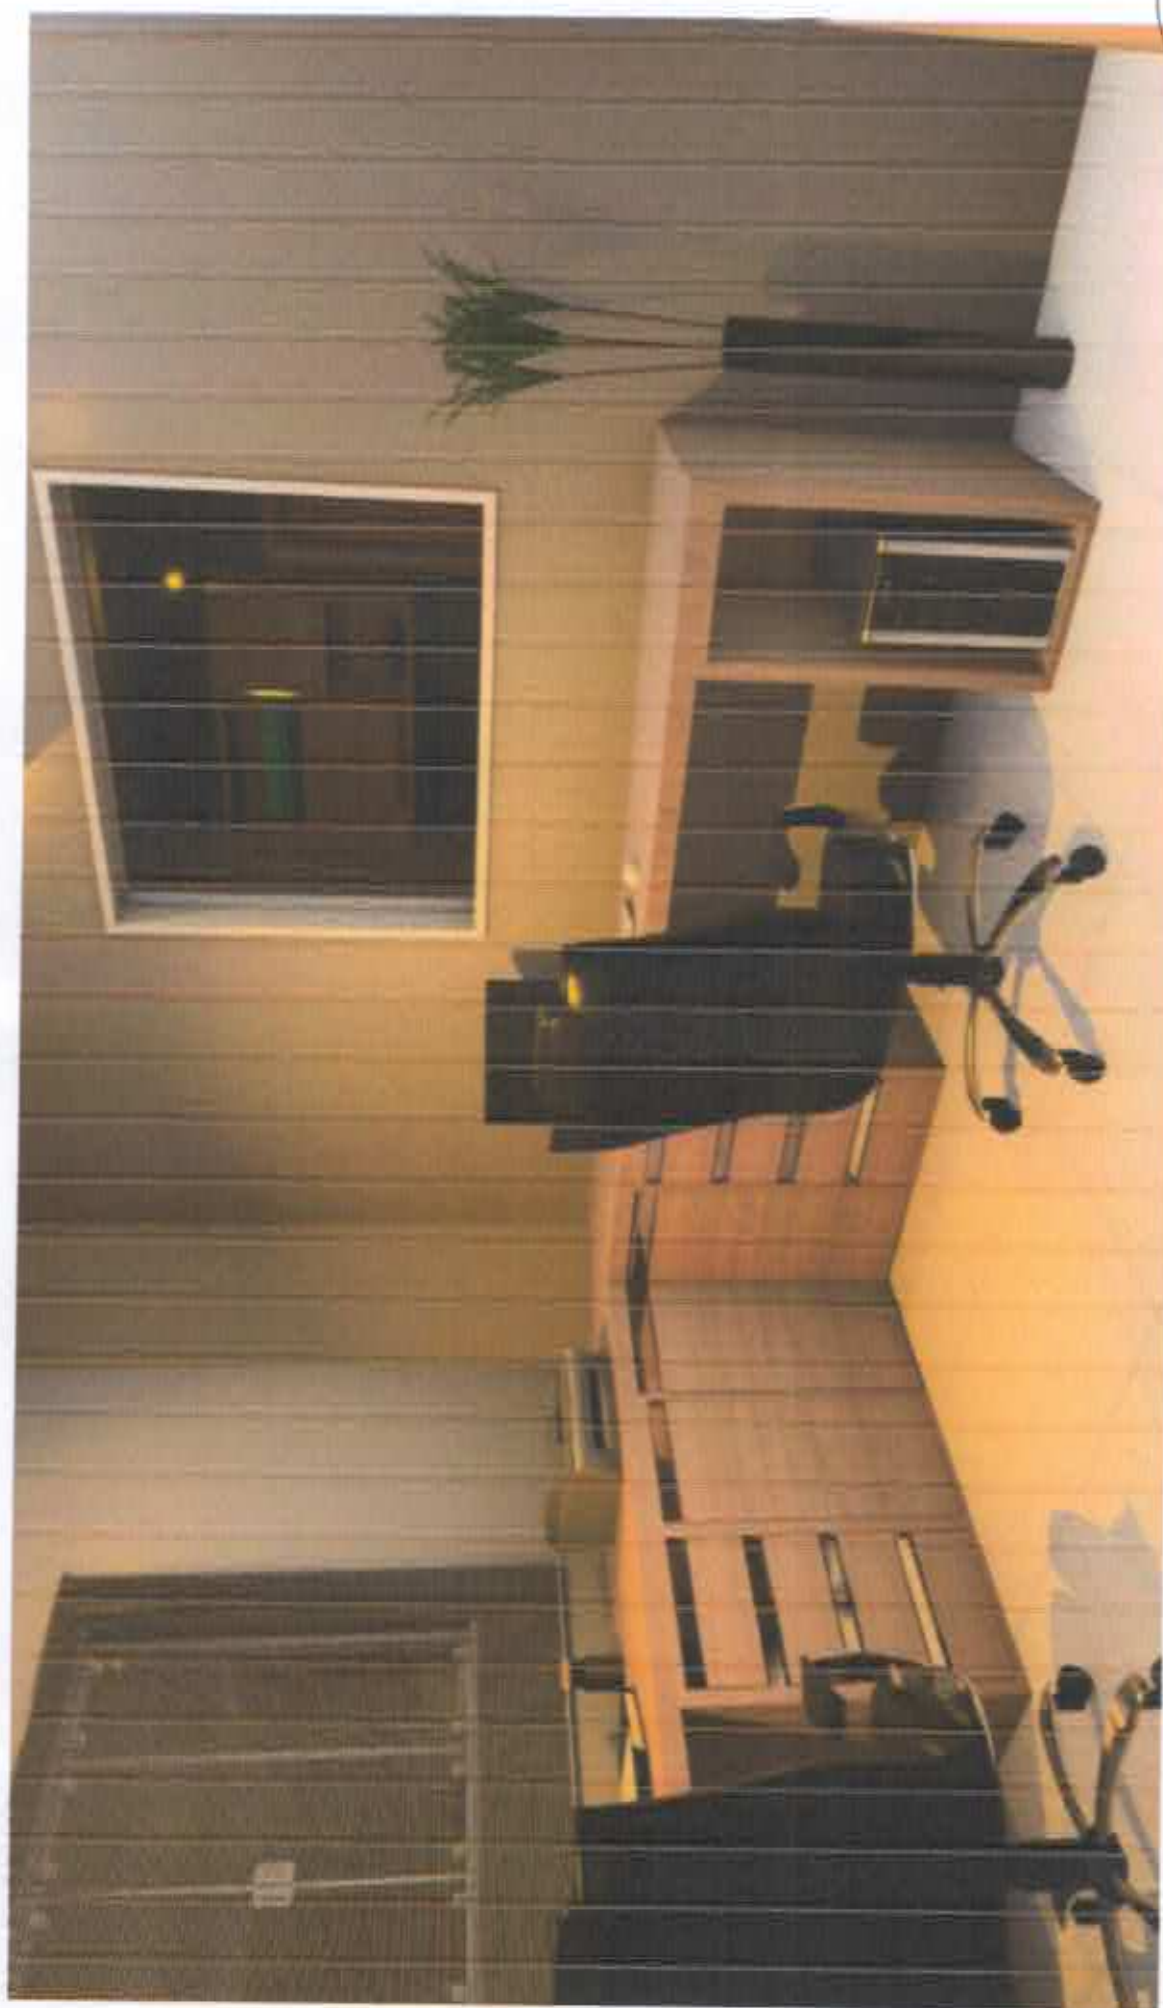

2.5.4

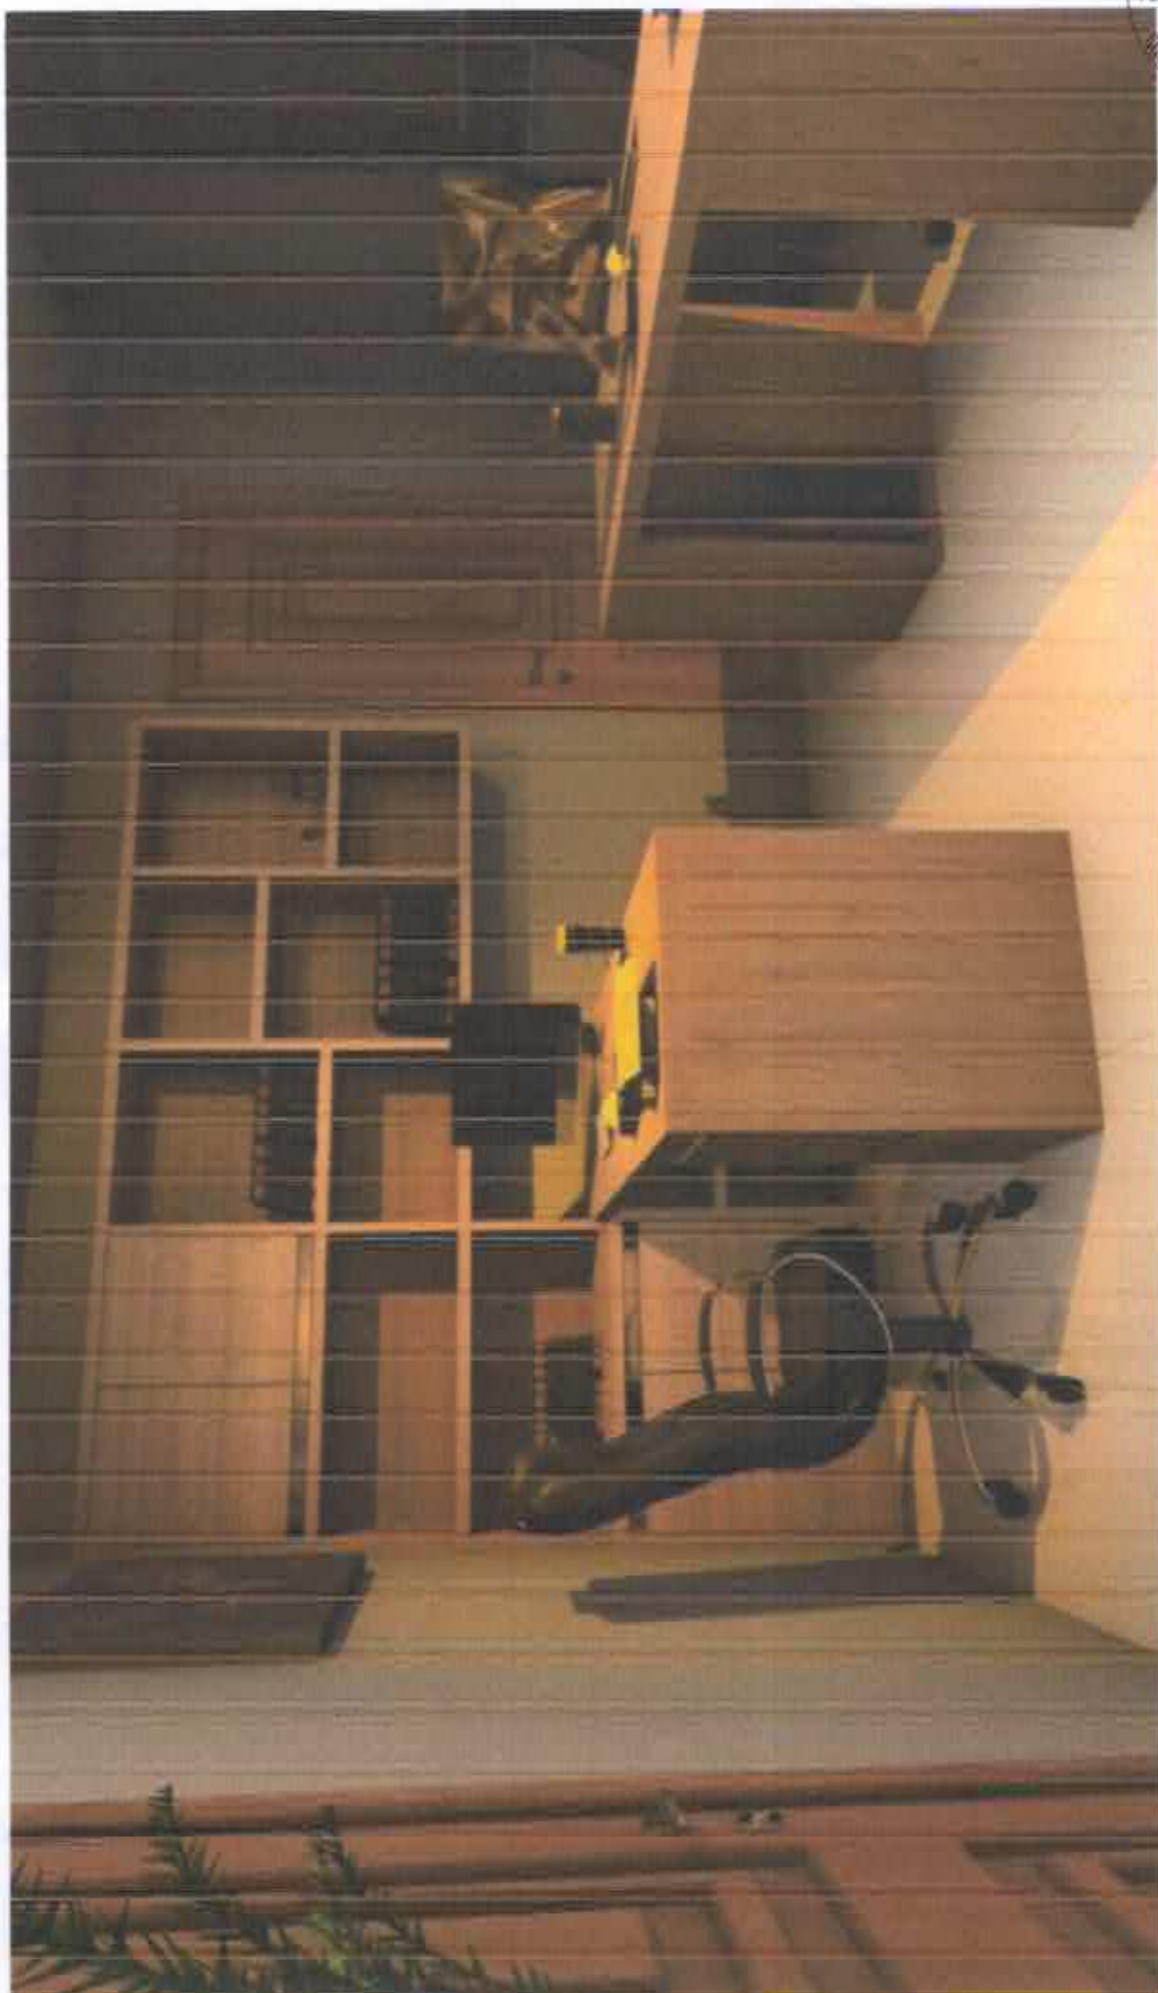



SECRETARIA MUNICIPAL
3
F

REPUBLICA BOLIVIANA
MINISTERIO DE CULTURA
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS Y LINGÜÍSTICAS

15/11/2015





99
A



14




PREFECTURA MUNICIPAL
FOLIO N° 106
DE ITAGUATINS - TC

10/11/14




15-11

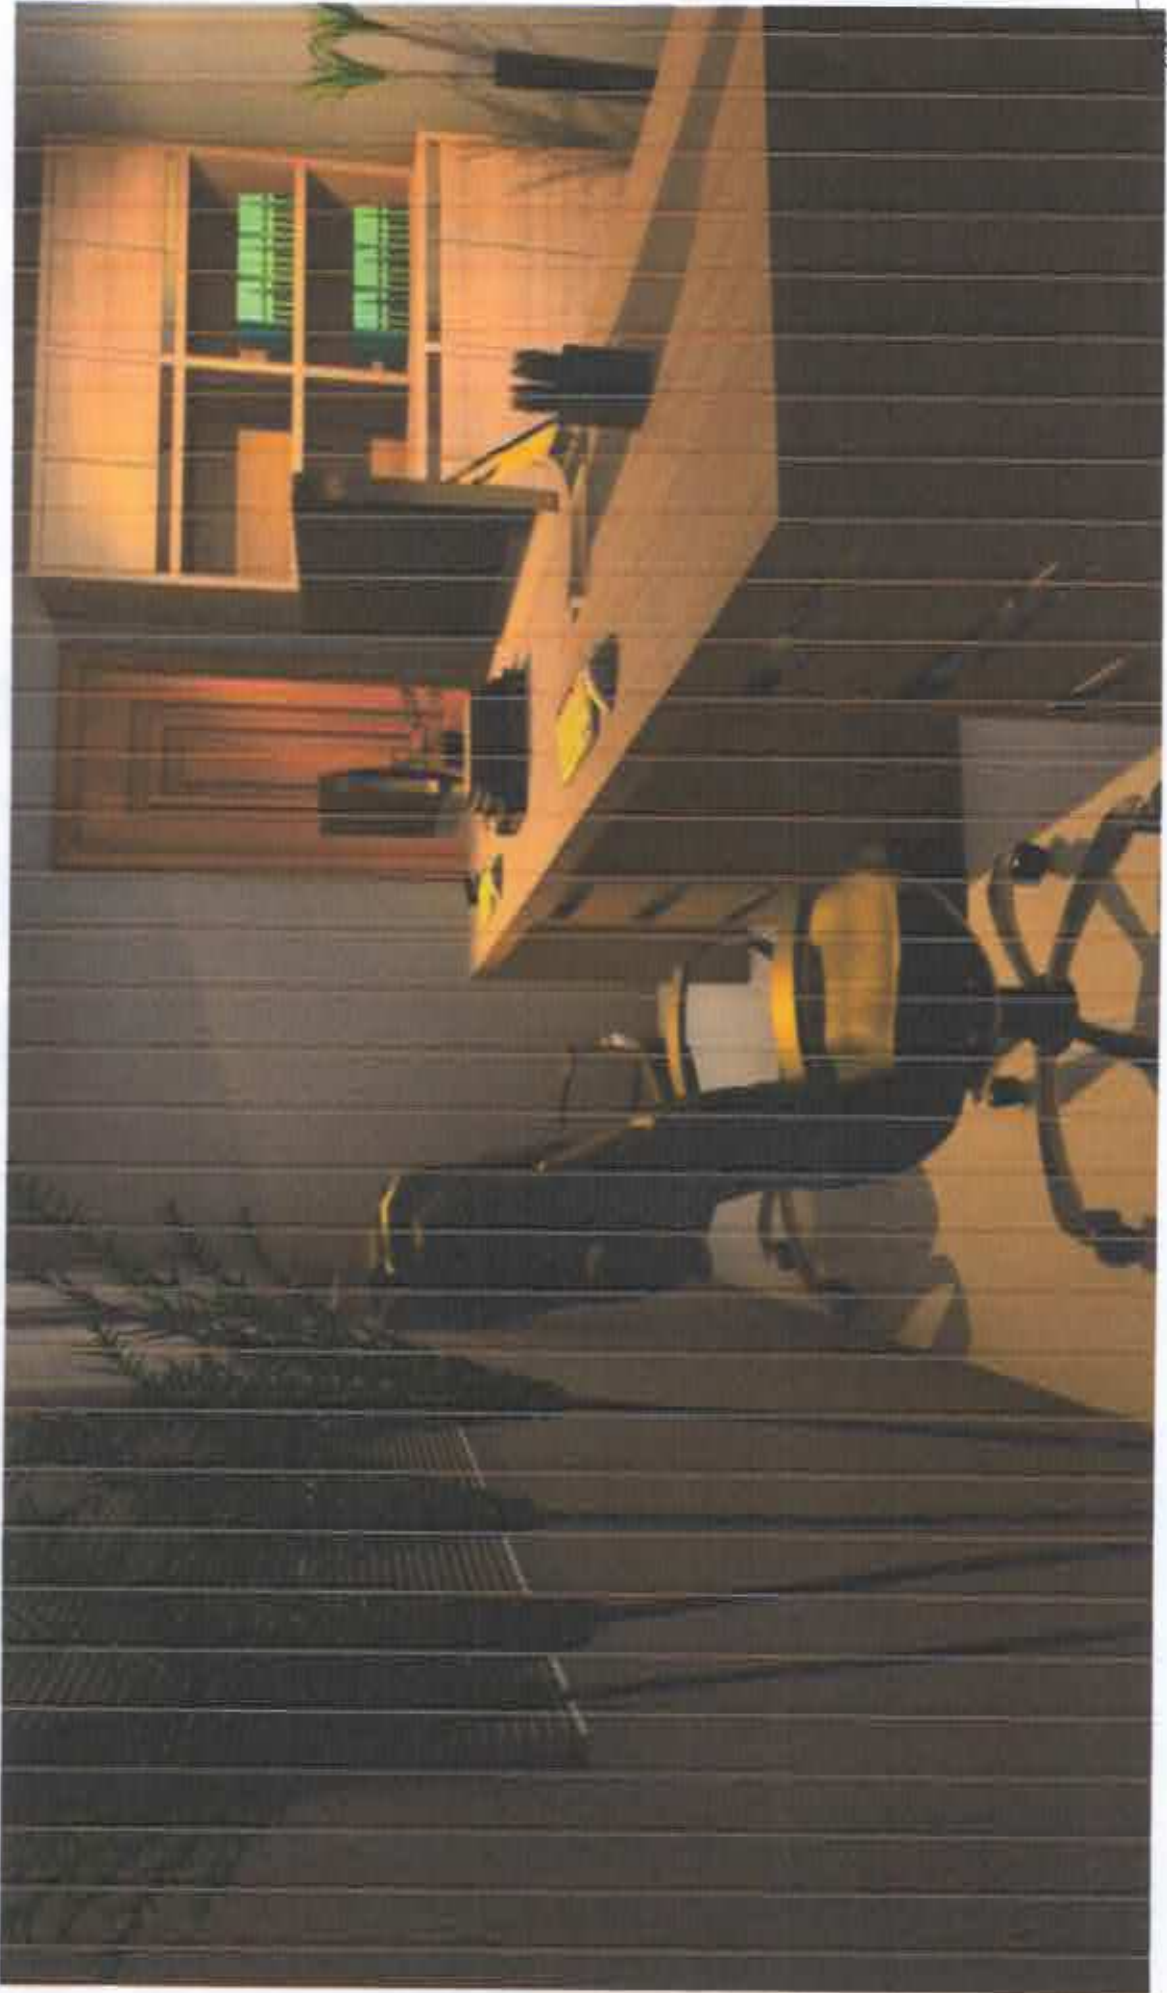



PREFEITURA MUNICIPAL
Folha Nº 024
DE ITAGUAÍTO, TO



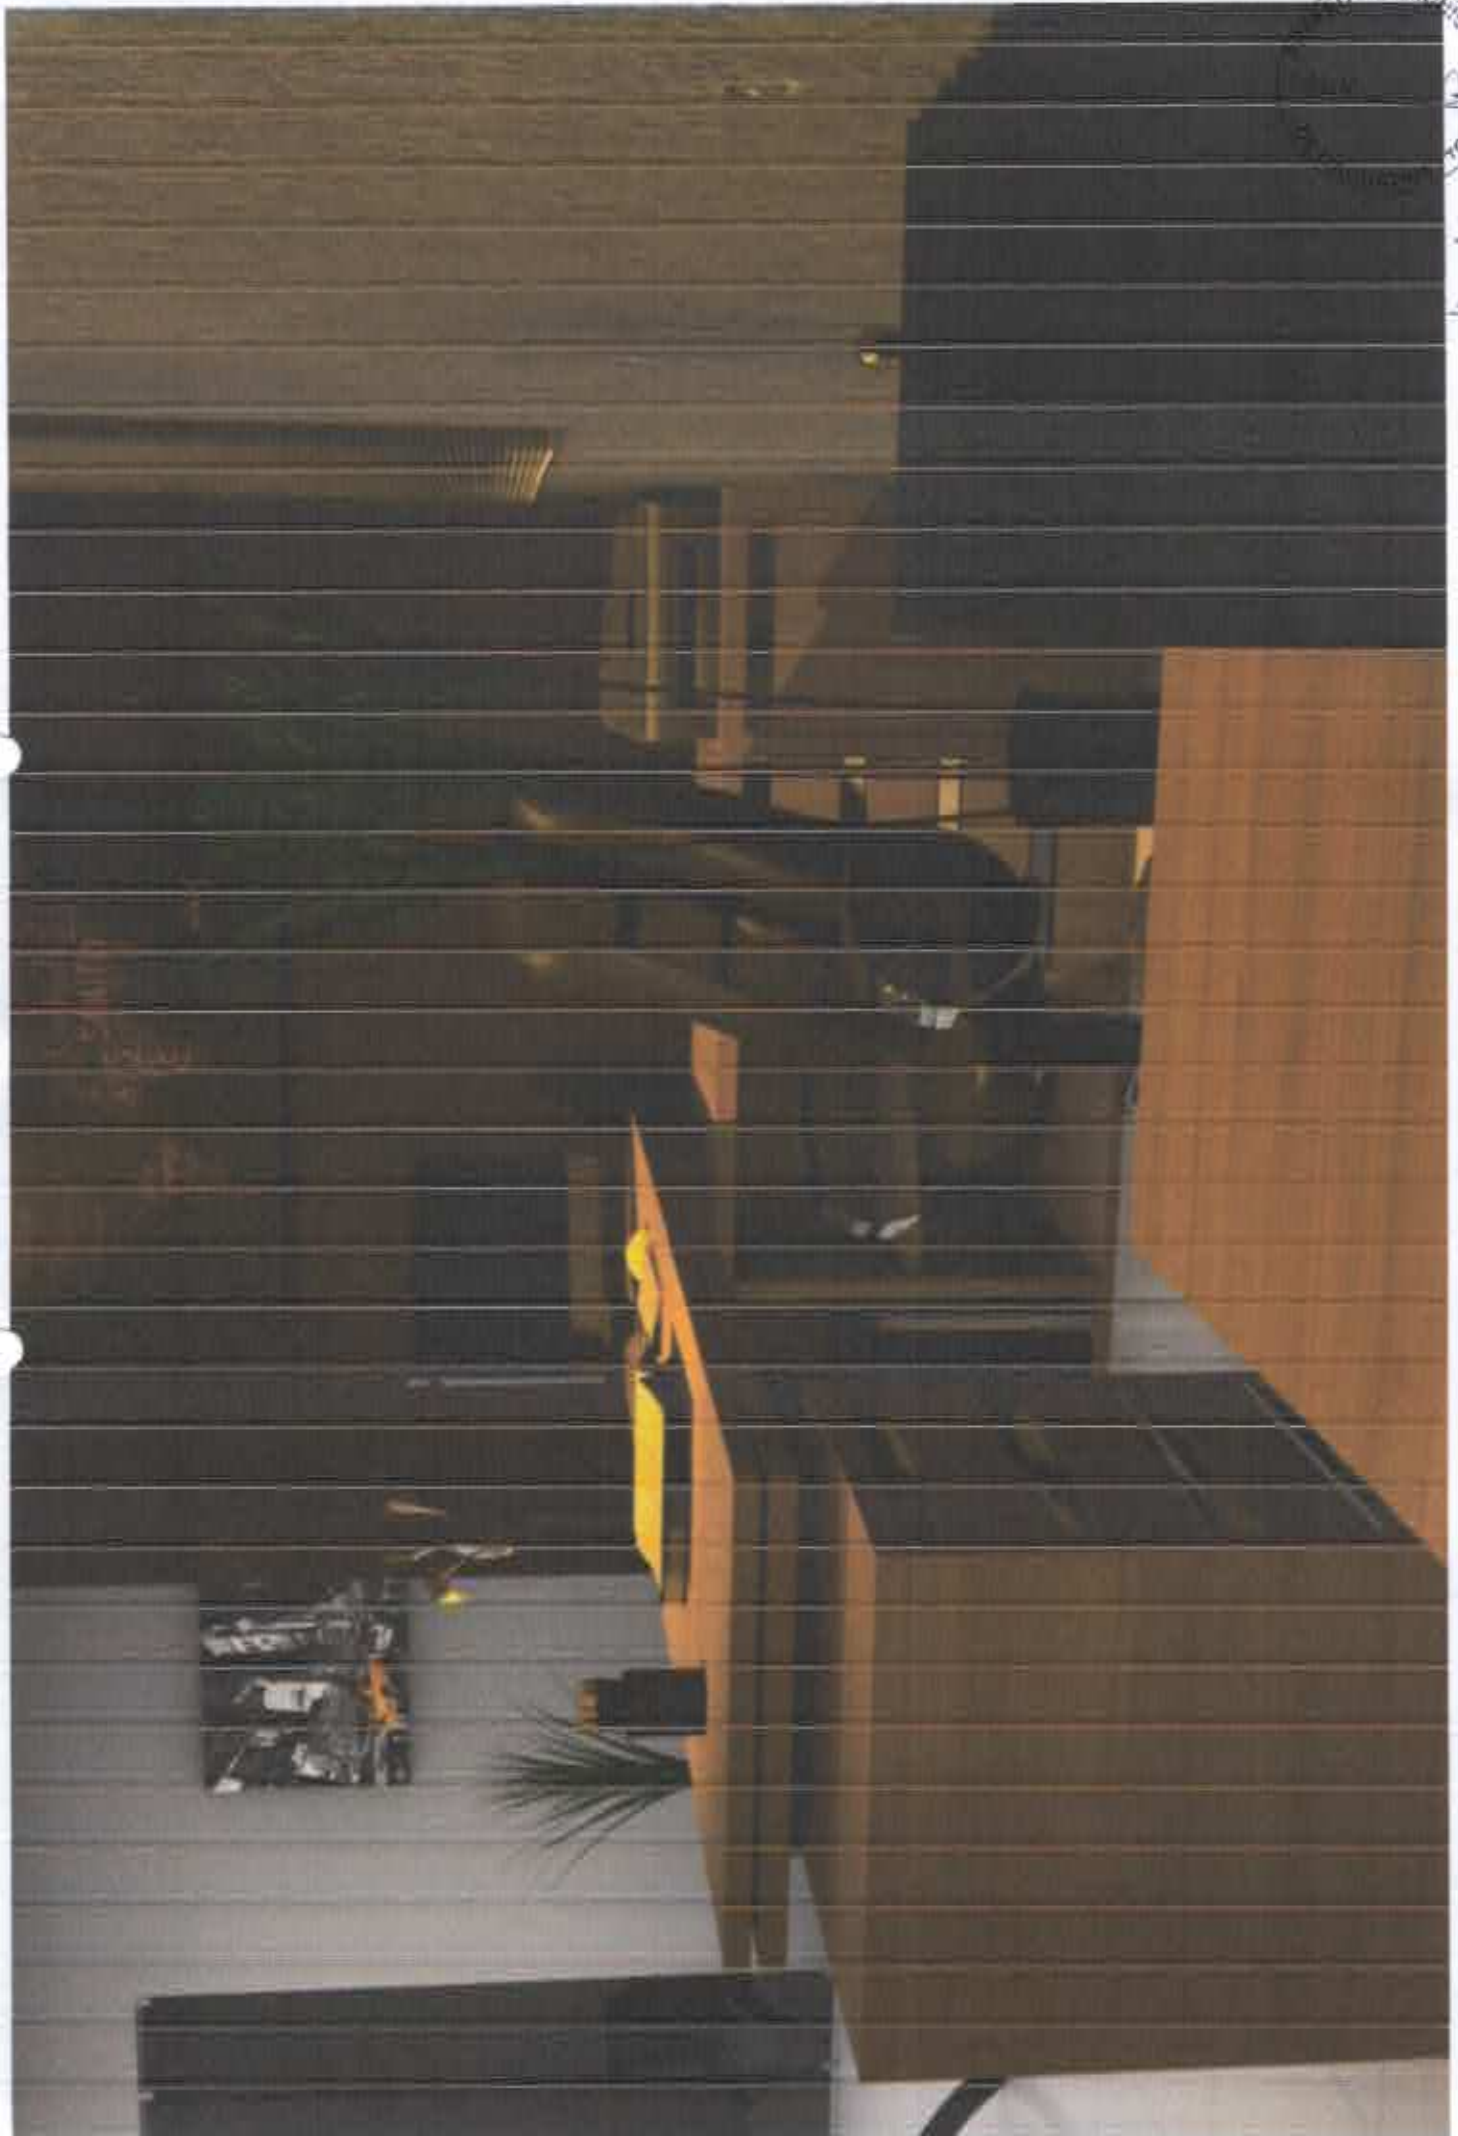

ARQUITECTURA MUNICIPAL
1984
DE PARAGUAY

1984
1984

